



Nieuwsbrief nummer 11 september 2023 nieuwbouw Jan Antonie Bijloo & Kinderopvang gro-up

Rotterdam, 21 september 2023

Beste ouders en verzorgers,

In de vorige nieuwsbrief nummer 10 (juli 2023) hebben wij u verteld over de ontwikkelingen van de bouwactiviteiten. Via deze brief willen wij u informeren over de voortgang.

Voortgang van de nieuwbouw

Na een lange periode van weinig zichtbare bouwactiviteiten heeft de aannemer de hele zomervakantie doorgewerkt. Het resultaat van zijn werk is inmiddels goed te zien! De vloeren zijn gestort, de buitenwanden zijn geplaatst en het metselwerk is al zichtbaar.

De afgelopen periode zijn er door u vragen aan ons gesteld over de voortgang. Tot vorige week was de planning van de aannemer dat zij de opleverdatum zouden gaan halen, zij hebben dit tot vorige week ook steeds met ons gecommuniceerd.

De aannemer heeft afgelopen week helaas moeten concluderen dat zij de oorspronkelijke opleverdatum toch niet gaan halen. Er zijn te veel tegenslagen geweest in o.a. leveringen, waardoor zij uitlopen op de planning.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de nieuwe opleverdatum wordt en kunnen wij helaas nog niet bepalen op welk moment de verhuizing zal plaatsvinden.

In overleg en afstemming met de betrokkenen binnen Stichting Boor en gro- up bekijken we de komende periode mogelijke scenario's. Zodra wij hier meer duidelijkheid over kunnen geven informeren wij u hierover. Dit is afhankelijk van diverse factoren waarop wij als school geen invloed hebben. Wij verwachten dat dit in november of december zal zijn.

Wij begrijpen dat dit net zo'n teleurstelling is voor u als voor ons, maar we blijven positief! We blijven de bouw op de voet volgen zodat de kwaliteit gewaarborgd is.





Obs Jan Antonie Bijloo
Rodaristraat 31
3066 LA Rotterdam

www.jabijloo.nl
T: 010 - 42 00 811
E: info@jabijloo.nl



Foto's

Hieronder delen we graag u paar foto's met u van de nieuwbouw.

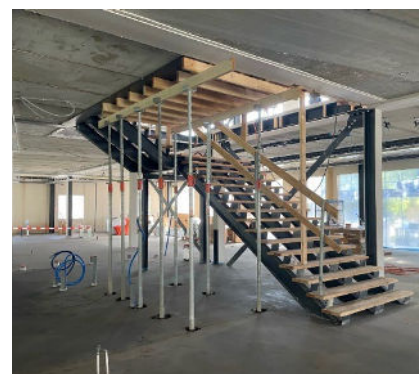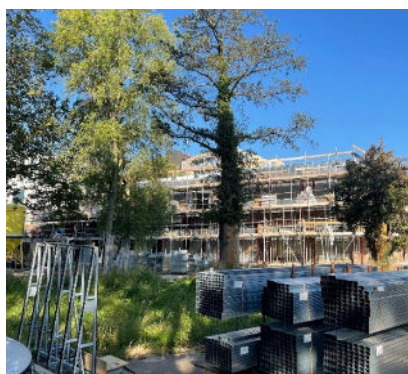

Vooruitzicht

De komende periode zal de aannemer het gevelmetselwerk afmaken. Het is van belang dat de gevel wind- en waterdicht is (dus kozijnen inclusief glas) om in het gebouw te kunnen gaan werken. Daarna komt een lange periode dat de werkzaamheden vanaf de buitenzijde niet zichtbaar zullen zijn. Dan wordt er aan de binnenkant hard gewerkt! Denk daarbij aan het plaatsen van binnenwanden, leidingwerk (elektra, water, riolering), tegelwerk, afmonteren van sanitair, het leggen van de vloerafwerking en schilderwerk.

Wij hopen u met deze nieuwsbrief voldoende te hebben geïnformeerd over de nieuwbouw. Heeft u vragen stelt u deze dan gerust!

Hartelijke groet,

Manon Marchelinus (directeur Jan Antonie Bijloo)

Agnes de Groot (locatiemanager gro-up)



Obs Jan Antonie Bijloo
Rodaristraat 31
3066 LA Rotterdam

www.jabijloo.nl
T: 010 - 42 00 811
E: info@jabijloo.nl

